



PROYECTO
TREN DE CERCANÍAS
DEL VALLE DEL CAUCA

INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2021



PROYECTO TREN DE
CERCANÍAS DEL VALLE
DEL CAUCA

ENTIDADES TERRITORIALES

Clara Luz Roldán González
Gobernación del Valle del Cauca

Jorge Iván Ospina Gómez
Alcaldía Distrital de Santiago de Cali

Andrés Felipe Ramírez Restrepo
Alcaldía de Jamundí

Oscar Eduardo Escobar García
Alcaldía de Palmira

Jhon Jairo Santamaría Perdomo
Alcaldía de Yumbo

EQUIPOS TÉCNICOS

Gobernación del Valle del Cauca

Alcaldía de Santiago de Cali
EMCALI E.I.C.E. E.S.P
METRO CALI

Alcaldía de Jamundí

Alcaldía de Palmira

Alcaldía de Yumbo

Estructurador: Financiera de
Desarrollo Nacional - FDN

Aliado: ProPacífico

INFORME EJECUTIVO
NOVIEMBRE 2021





PROYECTO TREN DE
CERCANÍAS DEL VALLE
DEL CAUCA

En el marco del **PROYECTO TREN DE CERCANÍAS DEL VALLE DEL CAUCA (TCV)** se presenta el informe del mes de noviembre de 2021 con el objetivo de compartir y socializar las principales gestiones y acciones lideradas por los actores de las diferentes instituciones participantes, que gracias al trabajo conjunto avanzan en la estructuración técnica, financiera e institucional que requiere el proyecto.

Este informe da cuenta de las actividades programadas en el marco de la etapa de factibilidad del proyecto TCV, que tiene como aliado estratégico a la Financiera de Desarrollo Nacional - FDN, que según el cronograma de trabajo aprobado en la región, han desarrollado las acciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el convenio interadministrativo Marco de Cooperación

Por otro lado, se comparten las gestiones y avances del componente institucional respecto a la conformación de la Autoridad Regional de Transporte - ART y el Ente Gestor Regional - EGR.



¹ Estos informes ejecutivos se elaboran desde el proceso de sistematización de la experiencia del proyecto TCV, como parte de los productos que buscan fortalecer la gestión del conocimiento y con ello la socialización y apropiación del proyecto. Aprobó y revisó: Ingeniero Luis Fernando Liberos R, Subsecretario de Planeación y Macroproyectos de Infraestructura del Transporte, Supervisor Gobernación. Elaboró: Ángela Ojeda, Carolina Charton y Giovanna Brand - contratistas Gobernación del Valle del Cauca.

INFORME EJECUTIVO
NOVIEMBRE 2021



PROYECTO TREN DE
CERCANÍAS DEL VALLE
DEL CAUCA

Nuestros avances

En el mes de noviembre se continuó en la ejecución de la factibilidad del proyecto TCV. La FDN como responsable de la estructuración, ha concentrado los esfuerzos en las actividades de cada uno de los componentes, para garantizar el avance y consolidación de los entregables, por parte de la empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U, así como en adelantar acciones estratégicas en el territorio para como base del proceso.

Según lo programado, la FDN ha liderado acciones estratégicas, con acompañamiento y participación de la región, para avanzar en la consecución de información de base para el proceso de lectura, análisis y posterior elaboración de entregables, entre ellos:

- ✓ Plan de trabajo y cronograma
- ✓ Debida diligencia
- ✓ Trabajos de campo: estudios de demanda y estudios de tránsito

Otro logro importante fue la suscripción del contrato interadministrativo derivado #0563 del 11 de noviembre de 2021, para el desarrollo de las etapas 2B y 3 que se venía gestionando desde meses atrás, el cual tiene por objeto llevar a cabo el diseño de la transacción, la estructuración técnica, legal y financiera a nivel de factibilidad y el acompañamiento en las actividades precontractuales para la licitación, adjudicación, suscripción de los diferentes contratos que implicarán el proyecto del sistema de transporte férreo intermunicipal en el tramo priorizado.

Dicho contrato fue suscrito entre el departamento del Valle, el distrito de Santiago de Cali, el municipio de Jamundí y el FONDES como contratantes, y la FDN como contratista. Esta etapa se encuentra financiada con recursos del Gobierno Nacional, mediante el FONDES, y el Gobierno Británico, con recursos del Prosperity Programme.

INFORME EJECUTIVO
NOVIEMBRE 2021

Nuestros avances

El seguimiento y monitoreo está a cargo del Comité Técnico del proyecto que preside la Gobernación del Valle del Cauca. En el mes de noviembre se adelantaron 38 actividades, según 8 acciones estratégicas, las cuales fueron desarrolladas de manera conjunta entre las entidades que lideran y participan en el proyecto, tal como se puede observar en el siguiente resumen:

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS MES DE NOVIEMBRE	TEMA / ENTIDAD	Noviembre
1	Comité Técnico del Proyecto TCV etapa 2A, Comité Técnico Convenio Marco y Comité Estratégico	02, 09 y 16
2	Reuniones socialización del proyecto TCV con actores institucionales para articulación: Emcali Secretaría General; Acuavalle; - Voith Group, ANLA, CVC.	03, 17, 24 y 25.
3	Proceso ART - EGR: Proceso de autorizaciones de las corporaciones: Ordenanza 572 – Valle del Cauca; Acuerdo 512 – Santiago de Cali; Acuerdo 018 - Jamundí; Acuerdo 027 - Palmira; y Acuerdo 019 – Yumbo. Firma del convenio 0566.	10; 12; 13; 26; y 11. Firma contrato día 12.
4	Reuniones para solicitud de información para diseños del proyecto requeridos por FDN: EMCALI Telecomunicaciones y acueducto; Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual; grupos poblaciones Alcaldía de Cali;	04, 05, 08, 09 y 18,
5	Reuniones para seguimiento y monitoreo del proyecto: Tablero de control interno para monitoreo; seguimiento solicitudes de información;	11; 17, 19 y 22.
6	Trabajo de campo etapa factibilidad según componentes: Geotecnia; patologías estructurales; redes; tránsito; topografía, socialización talleres con la región; Metodología Encuestas Preferencias Declaradas	04, 05, 08, 09, 10, 17, 18, 22 y 29.
7	Reuniones estratégicas: Embajada del Gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte; Taller Identificación de barreras y oportunidades en el desarrollo de la red de ciclo-infraestructura para Cali-Región.	03 y 26.
8	Suscripción contrato interadministrativo derivado para el desarrollo de las etapas 2b y 3	11




PROYECTO TREN DE CERCANÍAS DEL VALLE DEL CAUCA

Componente Institucional

Con la Ordenanza y dos Acuerdos, se pasó a la suscripción del Convenio Interadministrativo 0566 entre el departamento del Valle del Cauca, el Distrito de Santiago de Cali y el Municipio de Yumbo para la conformación de una región de planeación y gestión que actuaría como ART de la aglomeración del sur occidente de Colombia en el Valle del Cauca (ASOVAC) y asumir el compromiso para crear una sociedad pública que actuará como EGR (inicialmente de quienes integren el primer tramo). A este convenio podrán adherirse Jamundí y Palmira, que a la fecha cuentan con los respectivos acuerdos municipales; así como Candelaria, Florida, Pradera, Vijes, La Cumbre y Dagua, como municipios de la aglomeración suroccidental del Valle del Cauca (ASOVAC), previa autorización de los Concejos Municipales.

Importancia de contar con una institucionalidad en la región:

- Permitir la coordinación entre las instituciones y toma de decisiones comunes.
- Abrir un espacio de diálogo y de confianza.
- Ofrecer un sistema de transporte integrado, atractivo para el usuario y herramienta de la dinámica socioeconómica del territorio y de la transición ecológica.
- Implementar una oferta de transporte público competitivo frente a los desafíos actuales y futuros
- Requisito de la Nación para la cofinanciación de la construcción del tren.
- Asegurar el éxito comercial y la calidad de servicio de transporte regional - Sistema Integrado de Transporte Regional SITR que integre y ponga en coherencia los diferentes modos de transporte para la sostenibilidad financiera y una tarifa asequible para el usuario.
- Inclusión de todos los actores del sistema en diagnósticos y soluciones de transporte. Que permita fortalecer el transporte formal
- Preparar las empresas de transporte público y fortalecerlas ante la llegada de un nuevo modo de transporte de pasajeros, como es el TCV

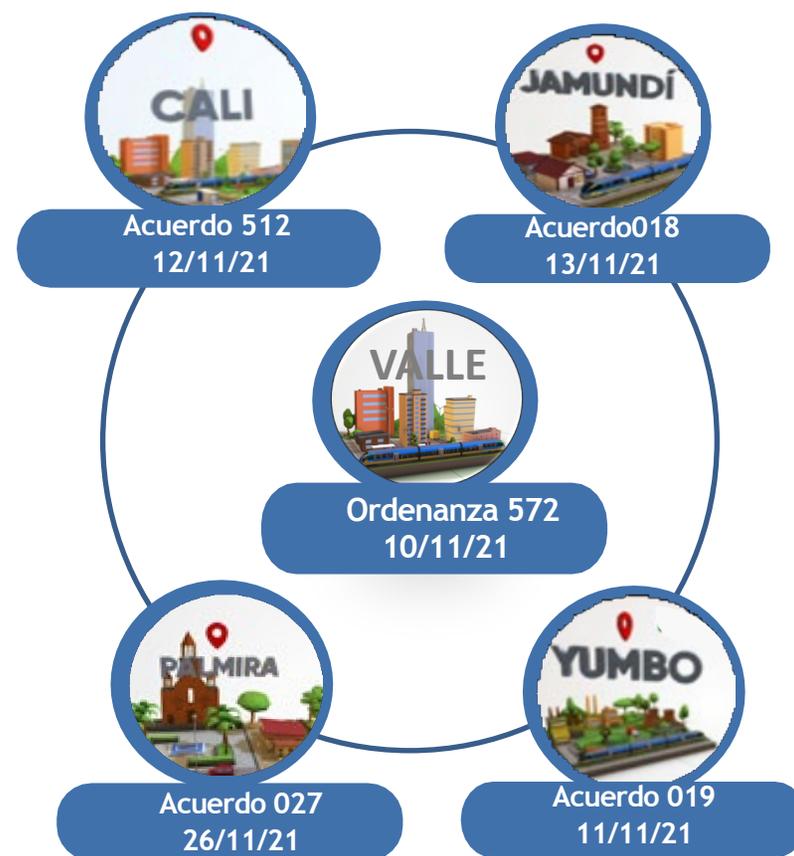

INFORME EJECUTIVO
NOVIEMBRE 2021



Alcaldía
de Yumbo



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA



Gobierno de los
Ciudadanos

PALMIRA
pa' lante



Alcaldía de Palmira



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA

